

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

3 MOŽNÁ ŘEŠENÍ

KONFERENCE ORTEX
30.-31. 5. 2024



ŘÍZENÍ PROJEKTŮ



- **PMI (Project Management Institute):**
"dočasná snaha zaměřená na vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku".
- **ISO 21500:**
"unikátní proces sestávající ze souboru koordinovaných a řízených činností s daty začátku a konce, podniknutý k dosažení cíle v souladu s konkrétními požadavky, včetně omezení časových, nákladových a zdrojových".


POJMY



- Cíle projektu
- Zdroje
- Harmonogram
- Etapy či Fáze
- Milníky
- Zúčastněné strany (stakeholders, sponzor)
- Rizika

- WBS

- hierarchický rozpad projektového rozsahu do menších komponent, až po nejmenší úkoly nebo pracovní balíčky (work packages).

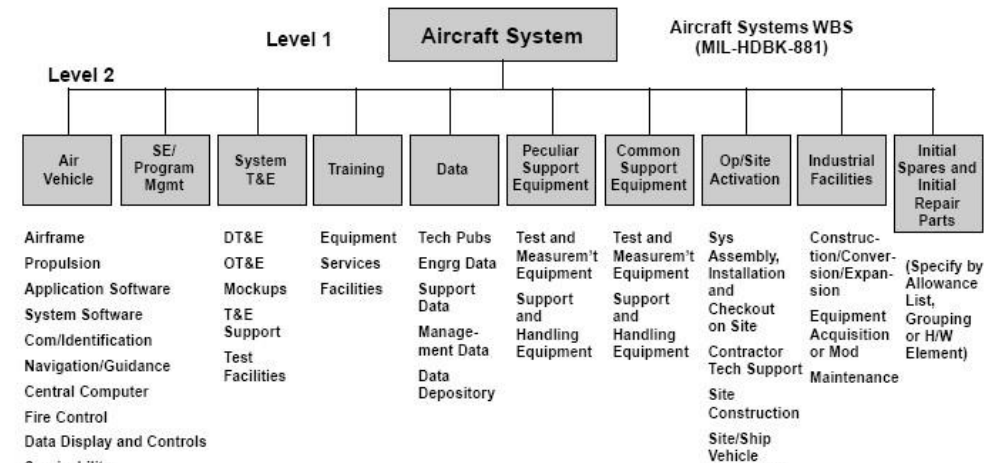

DIGITALIZACE ŘÍZENÍ PROJEKTŮ



- **Plánování projektu** (cíle, úkoly, milníky, termíny, závislosti)
- **Řízení úkolů** (WBS, úkoly, podúkoly, termíny)
- **Řízení zdrojů** (alokace odpovědných osob, využití, časové vytížení)
- **Rozpočet / Náklady** (řízení nákladů a timesheets)
- **Dashboardy, pohledy a reporting** (vizualizace stavu, různé pohledy)
- **Komunikace a spolupráce** (notifikace, e-mail, chat)
- **Řízení dokumentů** (přikládání a sdílení souborů, verzování, editace)
- **Integrace** (CRM, DMS, ERP, BI)
- **Řízení přístupu / řízení autorizace**
- **Podpora workflow a schvalovacích procesů**

VZOROVÝ PROJEKT – STAVBA FVE



- Název
- Popis
- Zákazník
- Vedoucí projektu
- Termíny Od – Do

VZOROVÝ PROJEKT – STAVBA FVE



- OBCHODNÍ KROKY

- Kontrola staveniště
- Nabídka
- **Podpis smlouvy**
- Archivace smlouvy

- PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

- Nákup materiálu
- Dodávka materiálu

- STAVBA

- Stavba konstrukce
- Montáž panelů

- ELEKTRINA

- Elektrické vedení
- Střídač
- Baterie
- Řídící jednotka
- Připojení k elektrické síti

- PŘEDÁNÍ

- Dokumentace
- **Předání zákazníkovi**

1. PROJEKTY OPEN – PROJEKT



PROJEKTY 24.1

Menu aplikace Přihlásit se jako... Workflow Datumová kalkulačka Upomínky Úkoly

Projekty Admin Uzav.obd úč/daň 31.03.2024 / 31.03.2024 Datum 27.05.2024

Menu Oblíbené Projekty - Vše, Všechny stavy

Uložit Návrát
Úpravy

Základní údaje (*) Účastníci WBS Etapy Milníky Podřízené projekty Projektový deník Strom projektu Dokumenty Aktivitty Úkoly vše Zakázka

Detail projektu

Číslo projektu **F240004**

Typ projektu **F** Projekty StavbyFVE

Název Stavba solární elektrárny

Uživatelská identifikace FVE3

Stav projektu plánovaný

Plnění 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Priorita Nedefinováno

Vedoucí projektu Projekty Admin

Číslo šablony

Účetní zakázka

Cíl
Výstavba střešní solární elektrárny včetně bateriového úložiště

Plán projektu

Plánované zahájení	<input type="text" value="21.05.2024"/>
Plánované ukončení	<input type="text" value="26.08.2024"/>
Plánované předání	<input type="text" value="30.08.2024"/>
Plánované náklady	<input type="text" value="0,0000"/>
Plánované výnosy	<input type="text" value="0,0000"/>
Plánované kapacity	<input type="text" value="0,00"/>

Skutečnost projektu

Skutečné zahájení	<input type="text"/>
Skutečné ukončení	<input type="text"/>
Skutečné předání	<input type="text"/>
Skutečné náklady	<input type="text" value="0,0000"/>
Skutečné výnosy	<input type="text" value="0,0000"/>
Skutečné kapacity	<input type="text" value="0,00"/>

Systémové údaje

Systémové číslo	<input type="text" value="6"/>
Založeno	<input type="text" value="16.05.2024 14:59:59"/>
Založil	<input type="text" value="projekty"/>
Aktualizováno	<input type="text" value="27.05.2024 14:13:56"/>
Aktualizoval	<input type="text" value="projekty"/>
Úroveň	<input type="text" value="0"/>
Nadřazený projekt	<input type="text"/>
Předcházející projekt	<input type="text"/>

Popis
Stavba FVE na střechu budovy

Zákazník

Zákazník

Adresa Praha
 Telefon
Zástupce E-mail
Web

Cílový zákazník

Cílový zákazník

Adresa Jméno 1
 Telefon
Zástupce E-mail
Web

Projekty - Vše, Všechny stavy

servis4:2158 | projekty | 27.05.2024 14:15:38 | e:\OpenSrvCETE\data.2

Projekty

- Základní data a parametry
- Projekty
 - Projekty
 - Šablony projektů
 - Vytíženost pracovníků

- Aplikační jádro
- CRM
- Projekty
- Administrace
- Finanční účetnictví
- Správa majetku
- Lidské zdroje
- Prodej
- Logistika
- Výroba

Uložit Návrat
Úpravy

Základní údaje (*) Účastníci WBS Etapy Milníky Podřízené projekty Projektový deník Strom projektu Dokumenty Aktivity Úkoly vše Zakázka

Detail projektu

Číslo projektu **F240004**

Typ projektu **F** Projekty StavbyFVE

Název

Uživatelská identifikace

Stav projektu

Plnění 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Priorita

Vedoucí projektu

Číslo šablony

Účetní zakázka

Cíl

Výstavba střešní solární elektrárny včetně bateriového úložiště

Přepínač úč.zakázek

Popis

Stavba FVE na střechu budovy

Zákazník

Zákazník

Adresa

Jméno 1

Telefon

E-mail

Web

Zástupce

Cílový zákazník

Cílový zákazník

Adresa

Jméno 1

Telefon

E-mail

Web

Zástupce

Plán projektu

Plánované zahájení

Plánované ukončení

Plánované předání

Plánované náklady

Plánované výnosy

Plánované kapacity

Skutečnost projektu

Skutečné zahájení

Skutečné ukončení

Skutečné předání

Skutečné náklady

Skutečné výnosy

Skutečné kapacity

Systémové údaje

Systémové číslo

Založeno

Založil

Aktualizováno

Aktualizoval

Úroveň

Nadřazený projekt

Předcházející projekt

1. PROJEKTY OPEN – WBS



Projekty - Vše, Všechny stavy

Uložit Návrat

Úpravy

Základní údaje (*) Účastníci WBS Etapy Milníky Podřízené projekty Projektový deník Strom projektu Dokumenty Aktivita Úkoly vše Zakázka

Identifikační kód	Název	Plán. datum od	Plán. datum do	Plán. náklady	Plán. kapacity	Plán. výnosy	Skut. náklady
Stavba solární elektrárny		2024-05-21	2024-08-26	97	0	2000	
Obchodní kroky		2024-05-21	2024-05-28	7	0	1000	
Kontrola staveniště		2024-05-20	2024-05-22	2	0	1000	
Nabídka		2024-05-23	2024-05-24	1	1	1000	
Podpis smlouvy		2024-05-27	2024-05-27	0	2	1000	
Uložení smlouvy		2024-05-28	2024-05-28	0	3	1000	
Příprava stavby		2024-05-29	2024-06-17	19	0	1000	
Nákup materiálu		2024-05-29	2024-06-10	12	0	1000	
Dodávka materiálu na		2024-06-11	2024-06-18	7	5	1000	
Stavba		2024-06-18	2024-06-25	7	0	1000	
Stavba konstrukce		2024-06-18	2024-06-20	2	0	1000	
Montáž panelů		2024-06-21	2024-06-27	6	7	1000	
Elektrifika		2024-06-26	2024-07-05	9	0	1000	
Elektrické vedení		2024-06-26	2024-06-26	0	0	1000	
Střídač		2024-06-27	2024-06-27	0	9	1000	

Základní údaje


Identifikační kód	Název	Plán. datum od	Plán. datum do	Plán. náklady	Plán. kapacity	Plán. výnosy	Skut. náklady
Kontrola staveniště	plánovaná	20.05.2024	22.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Nabídka	plánovaná	23.05.2024	24.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Podpis smlouvy	plánovaná	27.05.2024	27.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Uložení smlouvy	plánovaná	28.05.2024	28.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Nákup materiálu	plánovaná	29.05.2024	10.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Dodávka materiálu ...	plánovaná	11.06.2024	17.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Stavba konstrukce	plánovaná	18.06.2024	20.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Montáž panelů	plánovaná	21.06.2024	25.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Elektrické vedení	plánovaná	26.06.2024	26.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Střídač	plánovaná	27.06.2024	27.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Baterie	plánovaná	28.06.2024	28.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Řídící jednotka	plánovaná	01.07.2024	01.07.2024	0,0000	0,0000	0,0000	

Uložit Návrat

Úpravy

Základní údaje (*) Účastníci WBS Etapy Milníky Podřízené projekty Projektový deník Strom projektu Dokumenty Aktivity Úkoly vše Zakázka

Stavba solární elektrárny	2024-05-21	2024-08-26	97	0	2000
Obchodní kroky	2024-05-21	2024-05-28	7	0	1000
Kontrola staveniště	2024-05-20	2024-05-22	2	0	1000
Nabídka	2024-05-23	2024-05-24	1	1	1000
Podpis smlouvy	2024-05-27	2024-05-27	0	2	1000
Uložení smlouvy	2024-05-28	2024-05-28	0	3	1000
Příprava stavby	2024-05-29	2024-06-17	19	0	1000
Nákup materiálu	2024-05-29	2024-06-10	12	0	1000
Dodávka materiálu na	2024-06-11	2024-06-18	7	5	1000
Stavba	2024-06-18	2024-06-25	7	0	1000
Stavba konstrukce	2024-06-18	2024-06-20	2	0	1000
Montáž panelů	2024-06-21	2024-06-27	6	7	1000
Elektřina	2024-06-26	2024-07-05	9	0	1000
Elektrické vedení	2024-06-26	2024-06-26	0	0	1000
Střídač	2024-06-27	2024-06-27	0	9	1000



Základní údaje

Základní údaje Účastníci WBS Etapy Milníky Podřízené projekty Projektový deník Strom projektu Dokumenty Aktivity Úkoly vše Zakázka

Ident.WBS	Stav WBS	Garant WBS	Jméno+Příjmení	Plán.datum od	Plán.datum do	Plán.náklady	Plán.kapacity	Plán.výnosy	Skut.náklady
Začíná na	Bez výběru	Stejně	Nelze	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně
Kontrola staveniště	plánovaná	99000	Projekty Admin	20.05.2024	22.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Nabídka	plánovaná	99000	Projekty Admin	23.05.2024	24.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Podpis smlouvy	plánovaná	99000	Projekty Admin	27.05.2024	27.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Uložení smlouvy	plánovaná	99000	Projekty Admin	28.05.2024	28.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Nákup materiálu	plánovaná	99000	Projekty Admin	29.05.2024	10.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Dodávka materiálu ...	plánovaná	99000	Projekty Admin	11.06.2024	17.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Stavba konstrukce	plánovaná	99000	Projekty Admin	18.06.2024	20.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Montáž panelů	plánovaná	99000	Projekty Admin	21.06.2024	25.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Elektrické vedení	plánovaná	99000	Projekty Admin	26.06.2024	26.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Střídač	plánovaná	99000	Projekty Admin	27.06.2024	27.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Baterie	plánovaná	99000	Projekty Admin	28.06.2024	28.06.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Řídící jednotka	plánovaná	99000	Projekty Admin	01.07.2024	01.07.2024	0,0000	0,0000	0,0000	

1. PROJEKTY OPEN – NÁKLADY, ...



Projekt - Vše, Všechny stavy

Zobrazení Navigace Úpravy Nástroje Připojit Výstupy Nabídka Propojení Role osoby v projektu Stav

Základní údaje Účastníci WBS Etapy Milníky Podřízené projekty Projektový deník Strom projektu Dokumenty Aktivita Úkoly vše Zakázka

Zobrazení Úpravy Nástroje Připojit Výstupy Nabídka

Ident.WBS	Stav WBS	Garant WBS	Jméno+Příjmení	Plán.datum od	Plán.datum do	Plán.náklady	Plán.kapacity	Plán.výnosy	Skut.ná
Začíná na	Bez výběru	Stejně	Nelze	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně
Kontrola staveniště	plánovaná	99000	Projekty Admin	20.05.2024	22.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Nabídka	plánovaná	99000	Projekty Admin	23.05.2024	24.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Podpis smlouvy	plánovaná	99000	Projekty Admin	27.05.2024	27.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	

Základní údaje

Projekt: 6 F240004
Název WBS: Podpis smlouvy
Stav WBS: plánovaná
Nadřízené WBS: 0
Předchozí WBS: 2 Nabídka
Typ návaznosti: Dokončení-Zahájení
Popis WBS:

Vedoucí WBS
Vedoucí WBS: 99000 Projekty Admin

Etapa a účetní zakázka
Účetní zakázka: PR-001 FVE 3
Etapa: 10 Obchodní kroky

Milník
Milník: 1
Datum:

Náklady výnosy, kapacity

Plán.náklady	0,0000	Skut.náklady	0,0000
Plán.kapacity	0,0000	Skut.kapacity	0,0000
Plán.výnosy	0,0000	Skut.výnosy	0,0000

Systémové údaje

Systémové číslo: 3
Založil: projekty Aktualizoval: projekty
Datum založení: 17.05.2024 10:31:53 Datum aktualizace: 27.05.2024 14:19:53.460

Datумы činnosti v rámci WBS

Plán.datum od	27.05.2024	Skut.datum od	
Plán.datum do	27.05.2024	Skut.datum do	

Zobrazení Navigace Úpravy Nástroje Připojit Výstupy Nabídka Propojení Role osoby v projektu Stav

Základní údaje Účastníci WBS Etapy Milníky Podřízené projekty Projektový deník Strom projektu Dokumenty Aktivity Úkoly vše Zakázka

Ident.WBS	Stav WBS	Garant WBS	Jméno+Příjmení	Plán.datum od	Plán.datum do	Plán.náklady	Plán.kapacity	Plán.výnosy	Skut.ná
Začíná na	Bez výběru	Stejně	Nelze	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně
Kontrola staveniště	plánovaná	99000	Projekty Admin	20.05.2024	22.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Nabídka	plánovaná	99000	Projekty Admin	23.05.2024	24.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	
Podpis smlouvy	plánovaná	99000	Projekty Admin	27.05.2024	27.05.2024	0,0000	0,0000	0,0000	

Základní údaje

Projekt F240004

Název WBS

Stav WBS

Nadřazené WBS

Předchozí WBS Nabídka

Typ návaznosti

Popis WBS

Datумы činností v rámci WBS

Plán.datum od Skut.datum od

Plán datum do Skut.datum do

Vedoucí WBS

Vedoucí WBS Projekty Admin

Etapa a účetní zakázka

Účetní zakázka FVE 3

Etapa Obchodní kroky

Milník

Milník

Datum

Náklady výnosy, kapacity

Plán.náklady	<input type="text" value="0,0000"/>	Skut.náklady	<input type="text" value="0,0000"/>
Plán.kapacity	<input type="text" value="0,0000"/>	Skut.kapacity	<input type="text" value="0,0000"/>
Plán.výnosy	<input type="text" value="0,0000"/>	Skut.výnosy	<input type="text" value="0,0000"/>

Systémové údaje

Systémové číslo

Založil Aktualizoval

Datum založení Datum aktualizace

2. MS P4W – PROJEKT, WBS



Project

Stavba solární elektrárny

21. 5. - 12. 7.

Mřížka Panel Časová osa Grafy Lidé Cíle ...

Číslo o...	Název	Rychlý náhled	Priorita	Při...	Začátek	Konec	Doba trvání	% dokončení
1	STAVBA SOLÁRNÍ ELEKTRÁ...		Střední		21. 5. 2024	12. 7. 2024	38 d.	0
2	Obchodní kroky		Střední		21. 5. 2024	28. 5. 2024	6 d.	0
3	1.1.1 Kontrola staveniště	0/5	Střední		21. 5. 2024	22. 5. 2024	2 d.	0
4	1.1.2 Nabídka		Střední		22. 5. 2024	Dnes	2 d.	0
5	1.1.3 Podpis smlouvy	1/2	Střední		27. 5. 2024	27. 5. 2024	1 den	0
6	1.1.4 Archivace smlouvy		Střední		28. 5. 2024	28. 5. 2024	1 den	0
7	PŘÍPRAVA STAVBY		Střední		28. 5. 2024	17. 6. 2024	15 d.	0
8	1.2.1 Nákup materiálu		Střední		28. 5. 2024	10. 6. 2024	10 d.	0
9	1.2.2 Dodávka materiálu na st...		Střední		11. 6. 2024	17. 6. 2024	5 d.	0
10	STAVBA		Střední		18. 6. 2024	25. 6. 2024	6 d.	0
11	1.3.1 Stavba konstrukce		Střední		18. 6. 2024	19. 6. 2024	2 d.	0
12	1.3.2 Montáž panelů		Střední		20. 6. 2024	25. 6. 2024	4 d.	0
13	ELEKTRINA		Střední		26. 6. 2024	5. 7. 2024	8 d.	0
14	1.4.1 Elektrické vedení		Střední		26. 6. 2024	26. 6. 2024	1 den	0
15	1.4.2 Střídač		Střední		27. 6. 2024	27. 6. 2024	1 den	0
16	1.4.3 Baterie		Střední		28. 6. 2024	28. 6. 2024	1 den	0
17	1.4.4 Řídící jednotka		Střední		1. 7. 2024	2. 7. 2024	2 d.	0

+ Přidat nový úkol

Stavba solární elektrárny

Projektový manažer
Vaněk Jan | ORTEX
Generální ředitel, jednatel

Začátek ⓘ
20.05.2024

Konec
12.07.2024

Doba trvání
38 d.

Dokončeno %
0%

Úsilí
Dokončeno Zbývající Celkem
0 h + 248 h = 248 h

Nastavení kalendáře
 Vlastní výchozí pracovní týden
 Zvolit ze šablony
Výchozí šablona práce
Použít

Kalendáře prostředků určují, kdy členové skupiny pracují. Můžete je nakonfigurovat v Power Apps.
 Kalendáře prostředků

Stavba solární elektrárny

21. 5. - 12. 7.

Mřížka Panel Časová osa Grafy Lidé Cíle ...

Směrný p

Číslo o...	Název	Rychlý náhled	Priorita	Při...	Začátek	Konec	Doba trvání	% dokončení
1	STAVBA SOLÁRNÍ ELEKTRÁ...		Střední		21. 5. 2024	12. 7. 2024	38 d.	0
2	Obchodní kroky		Střední		21. 5. 2024	28. 5. 2024	6 d.	0
3	1.1.1	Kontrola staveniště 0/5	Střední		21. 5. 2024	22. 5. 2024	2 d.	0
4	1.1.2	Nabídka	Střední		22. 5. 2024	Dnes	2 d.	0
5	1.1.3	Podpis smlouvy 1/2	Střední		27. 5. 2024	27. 5. 2024	1 den	0
6	1.1.4	Archivace smlouvy	Střední		28. 5. 2024	28. 5. 2024	1 den	0
7	PŘÍPRAVA STAVBY		Střední		28. 5. 2024	17. 6. 2024	15 d.	0
8	1.2.1	Nákup materiálu	Střední		28. 5. 2024	10. 6. 2024	10 d.	0
9	1.2.2	Dodávka materiálu na st...	Střední		11. 6. 2024	17. 6. 2024	5 d.	0
10	STAVBA		Střední		18. 6. 2024	25. 6. 2024	6 d.	0
11	1.3.1	Stavba konstrukce	Střední		18. 6. 2024	19. 6. 2024	2 d.	0
12	1.3.2	Montáž panelů	Střední		20. 6. 2024	25. 6. 2024	4 d.	0
13	ELEKTRINA		Střední		26. 6. 2024	5. 7. 2024	8 d.	0
14	1.4.1	Elektrické vedení	Střední		26. 6. 2024	26. 6. 2024	1 den	0
15	1.4.2	Střídač	Střední		27. 6. 2024	27. 6. 2024	1 den	0
16	1.4.3	Baterie	Střední		28. 6. 2024	28. 6. 2024	1 den	0
17	1.4.4	Řídící jednotka	Střední		1. 7. 2024	2. 7. 2024	2 d.	0

+ Přidat nový úkol

Stavba solární elektrárny

Projektový manažer

Vaněk Jan | ORTEX
Generální ředitel, jednatel

Začátek ⓘ

20.05.2024

Konec

12.07.2024

Doba trvání

38 d.

Dokončeno %

0%

Úsilí

Dokončeno Zbývající Celkem

0 h + 248 h = 248 h

Nastavení kalendáře

Vlastní výchozí pracovní týden

Zvolit ze šablony


Výchozí šablona práce

Použít

Kalendáře prostředků určují, kdy členové skupiny pracují. Můžete je nakonfigurovat v Power Apps.

Kalendáře prostředků

2. MS P4W – TERMÍNY, NÁVAZNOSTI

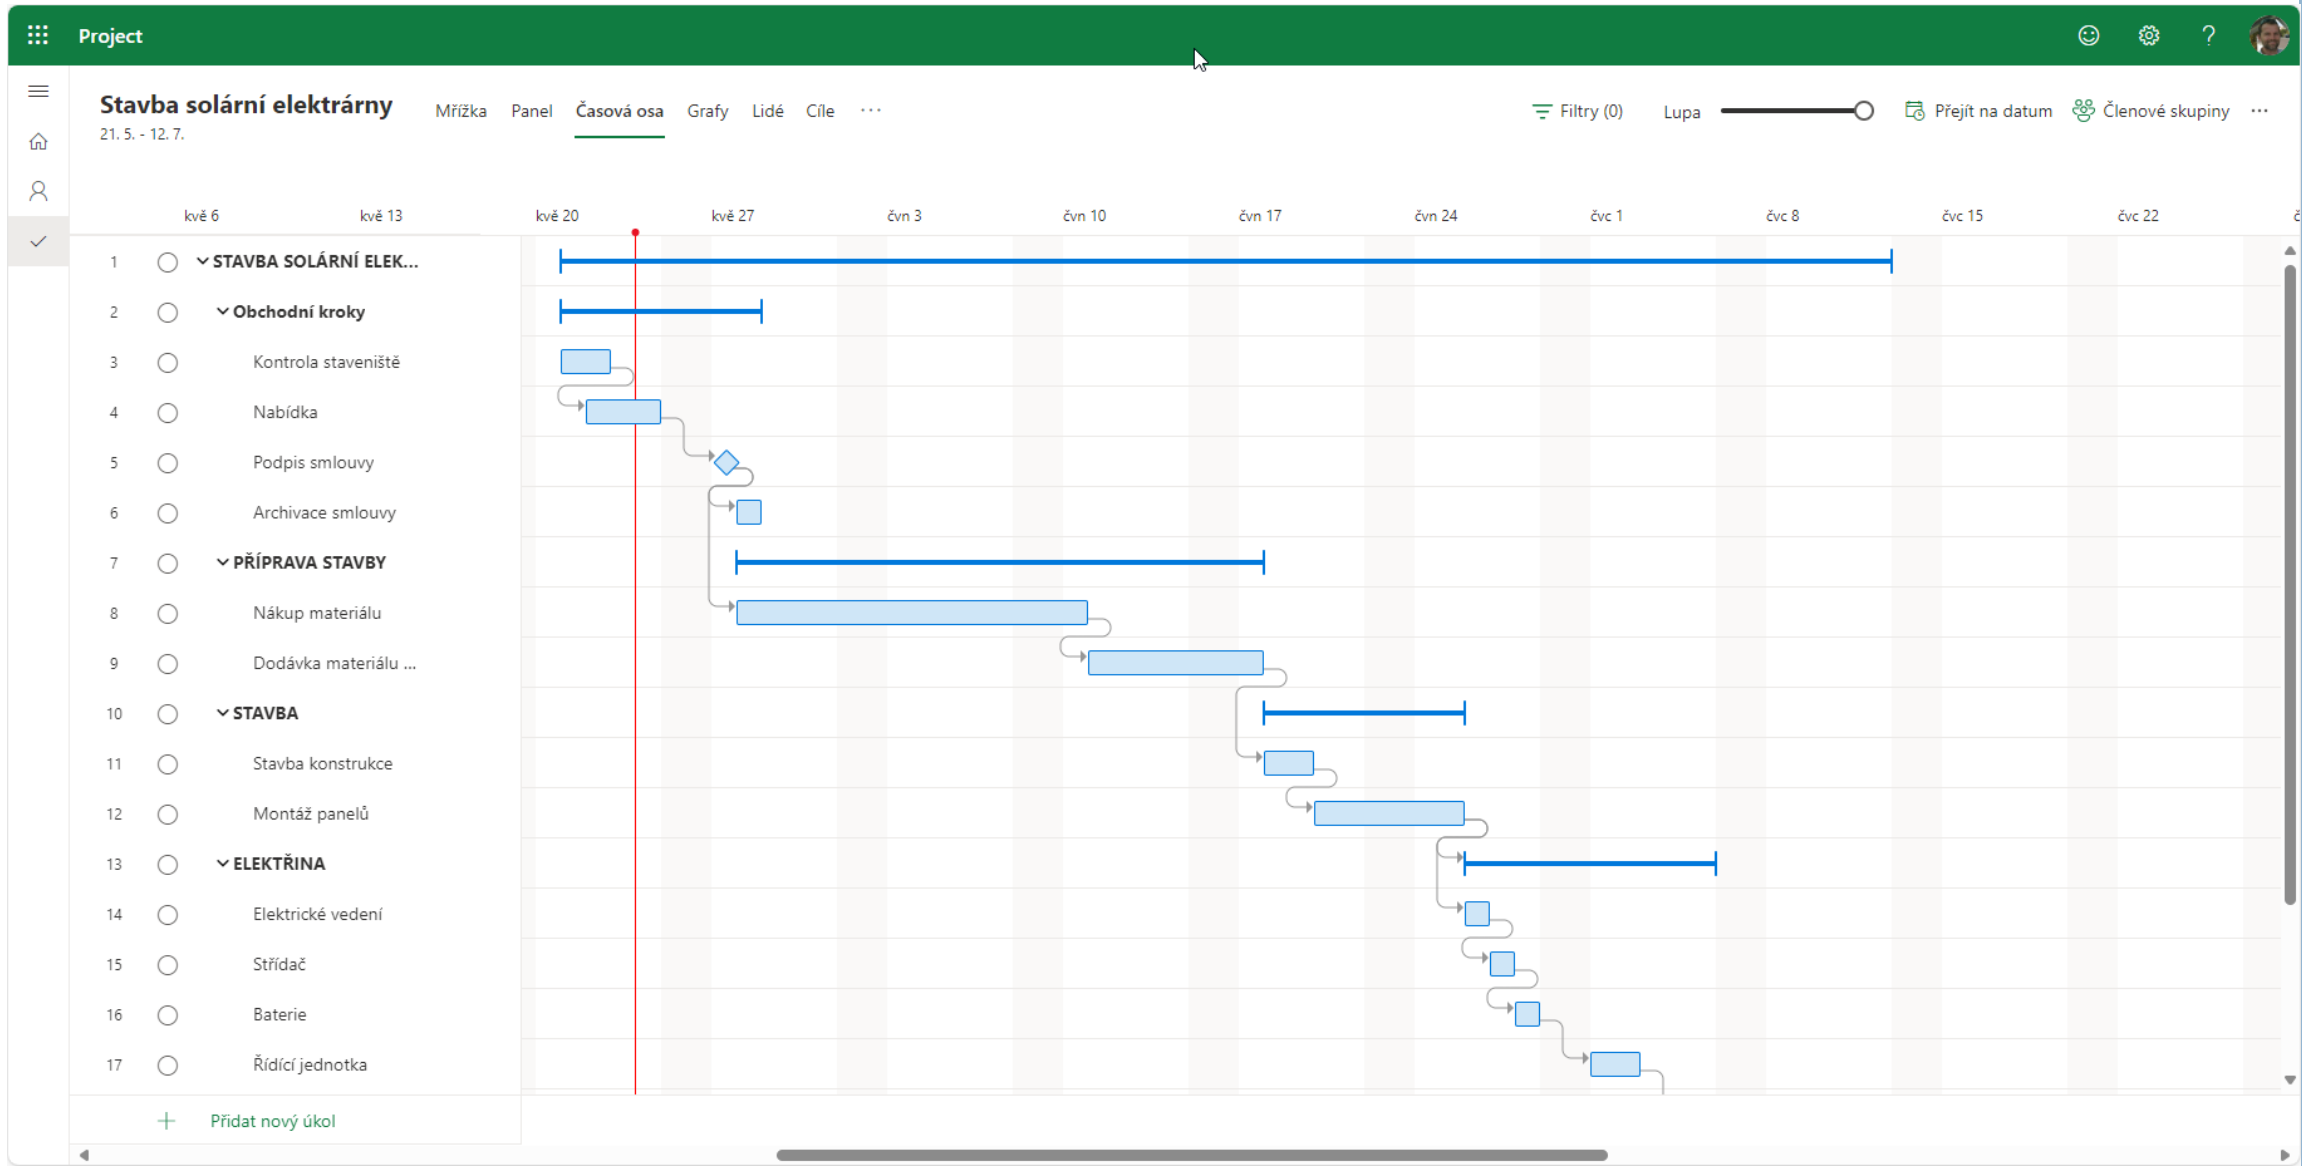


Stavba solární elektrárny

21. 5. - 12. 7.

Mřížka Panel Časová osa Grafy Lidé Cíle ...

🔍 Filtry (0) Lupa 🔍 📅 Přejít na datum 👥 Členové skupiny ...

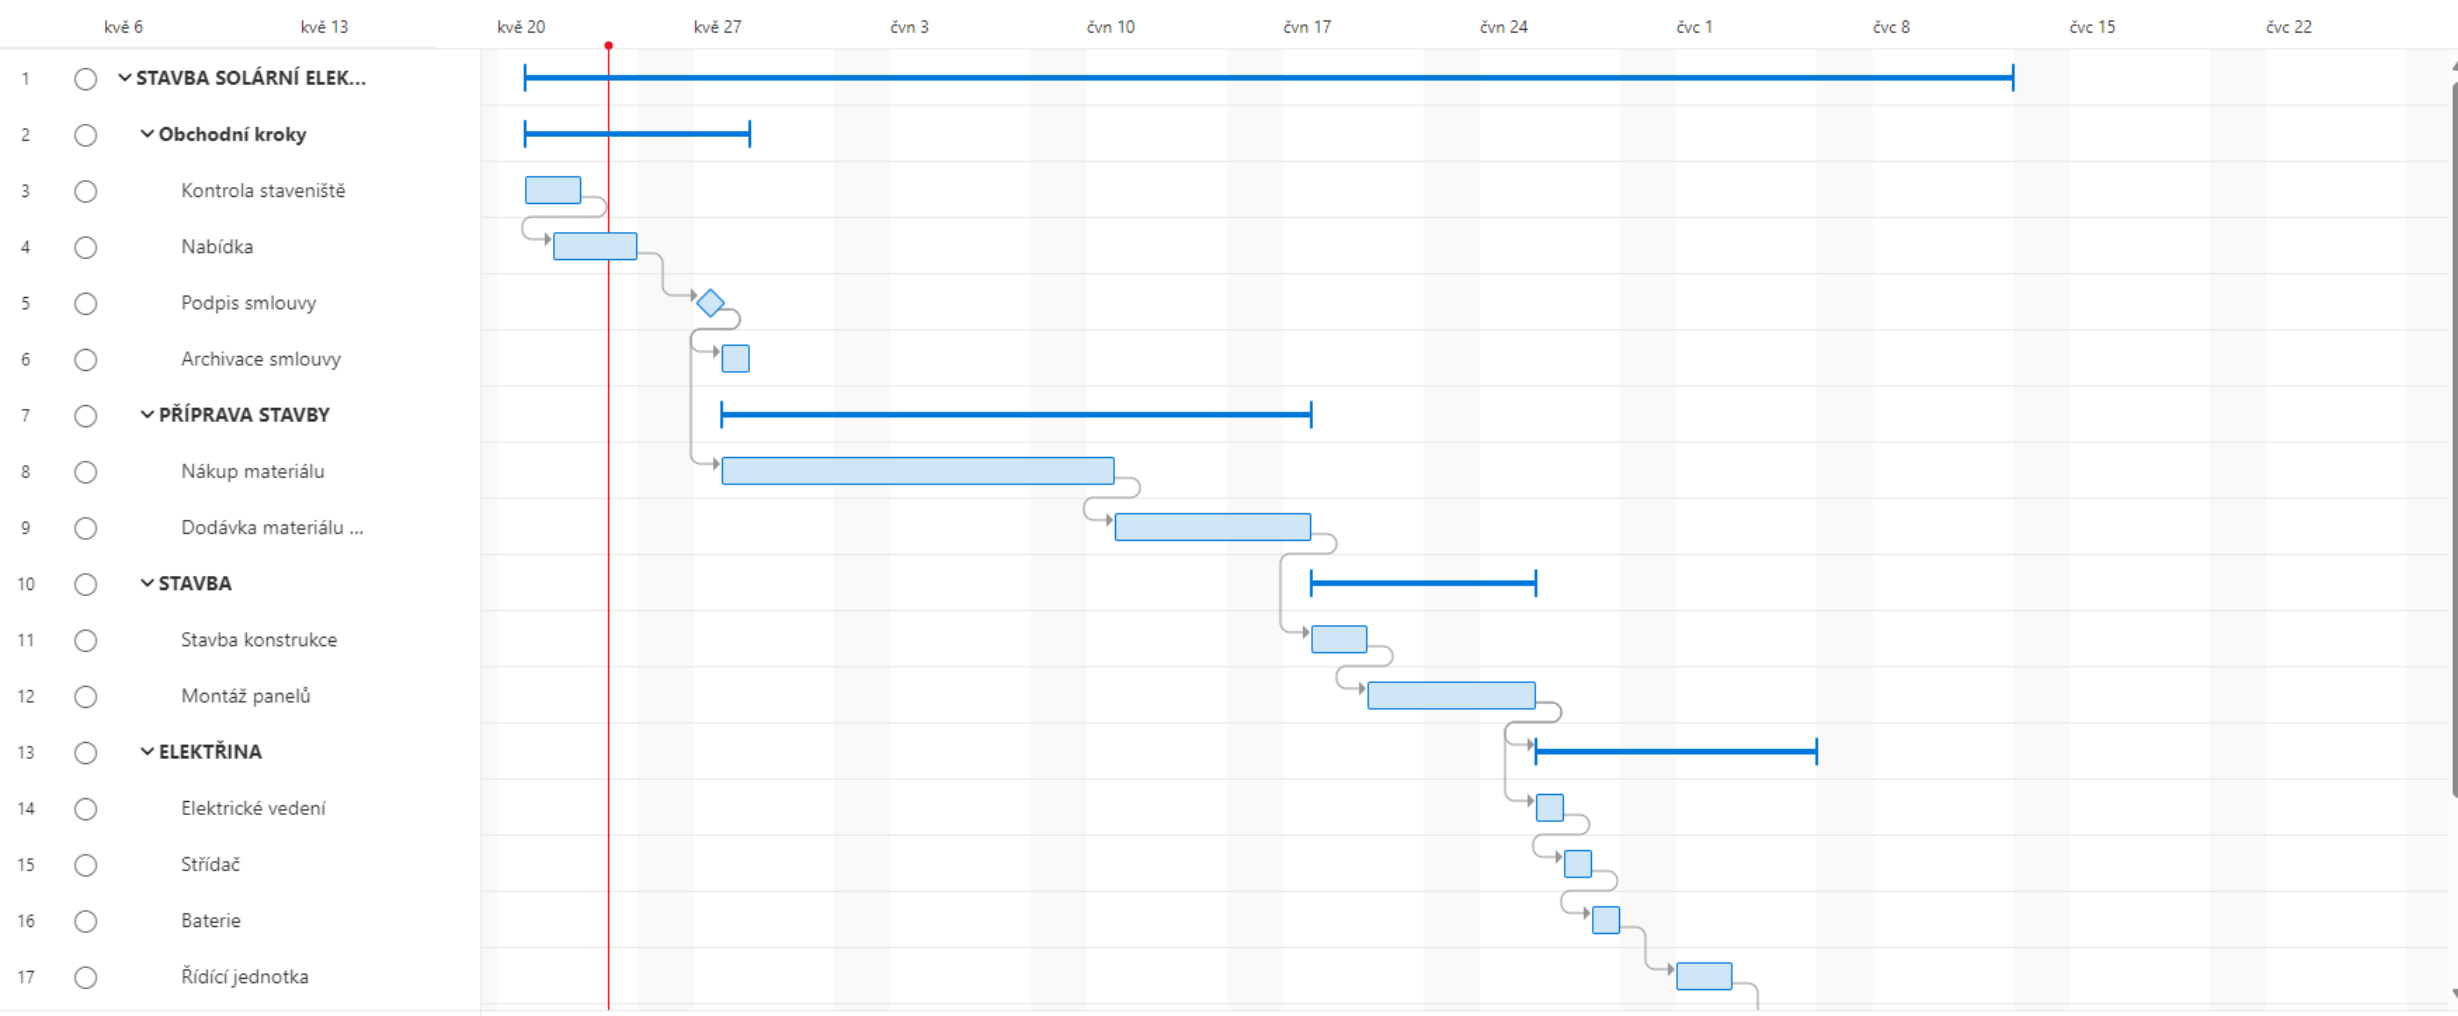

+ Přidat nový úkol

2. MS P4W – PŘIŘAZENÍ ZDROJŮ



Project

Stavba solární elektrárny

21. 5. - 12. 7.

Mřížka Panel Časová osa Grafy Lidé Cíle ...

Filtry (0) Seskupit podle Přirazeno komu Členové skupiny

Nepřirazeno

- Přidat úkol
- Nákup materiálu
dodavatel
10 d. 50 %
10.06
- Stavba konstrukce
dodavatel
2 d.
19.06
- Montáž panelů
dodavatel
4 d.
25.06
- Elektrické vedení
dodavatel
1 den
26.06
- Střídač
dodavatel
1 den

Vaněk, Jan

- Přidat úkol
- Podpis smlouvy
zákazník
0 d. 99 %
27.05
- Dokončeno 1**
- Nabídka
dodavatel
2 d. 100 %
24.05

Černohorský Jan

- Přidat úkol
- Archivace smlouvy
dodavatel
1 den
28.05
- Dokončeno 1**
- Kontrola staveniště
dodavatel
2 d. 100 %
22.05

Nováková Hana

- Přidat úkol
- Dodávka materiálu na stavbu
subdodavatel
5 d.
17.06

Stavba solární elektrárny

21. 5. - 12. 7.

Mřížka **Panel** Časová osa Grafy Lidé Cíle ...

Filtery

Nepřiřazeno

+ Přidat úkol

Nákup materiálu
dodavatel
10 d. 50 %
10.06

Stavba konstrukce
dodavatel
2 d.
19.06

Montáž panelů
dodavatel
4 d.
25.06

Elektrické vedení
dodavatel
1 den

Vaněk, Jan

+ Přidat úkol

Podpis smlouvy
zákazník
0 d. 99 %
27.05

^ Dokončeno 1

Nabídka
dodavatel
2 d. 100 %
24.05

Černohorský Jan

+ Přidat úkol

Archivace smlouvy
dodavatel
1 den
28.05

^ Dokončeno 1

Kontrola staveniště
dodavatel
2 d. 100 %
22.05

Nováková Hana

+ Přidat úkol

Dodávka materiálu na stavbu
subdodavatel
5 d.
17.06

3. EVIDENCE WEDA – PROJEKT



dms.ortex.cz/Forms/FormEvidence.aspx?Type=Edit&TabName=Projekt&Id=c08b65d5-5aaf-4fb9-8a6f-e10c7a3c987e – Pracovní – Microsoft Edge
https://dms.ortex.cz/Forms/FormEvidence.aspx?Type=Edit&TabName=Projekt&Id=c08b65d5-5aaf-4fb9-8a6f-e10c7a3c987e

Domů Administrátor WEDA ?

Data **Akce** **Dokumenty** **Historie**

Hlavička

Název projektu:* Stavba solární elektrárny ID:* 20240002
Číslo projektu: 20240002

Hlavní informace

Firma:*	ABC Enterprises	Kooperace:	
Nabídka:*	Stavba solární elektrárny	Finanční plnění:*	Jednorázové
Stav:	Rozpracováno	Kontaktní osoba:	Robert Ruml
Vedoucí projektu:	Vaněk Jan	Realizační tým:	A

Popis

Popis: Stavba FVE na střechu budovy

Poznámky:

Termíny

Termín zahájení: 14. 5. 2024 Termín dodání: 1. 8. 2024

3. EVIDENCE WEDA – WBS



Položky projektu

Fulltextové vyhledávání



Projekt	P...	Etapa	Název	Milník?	Datum ...	Zodpovědná osoba	Stav
20240002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
20240002	3	OBCHODNÍ KROKY	Kontrola staveniště		20. 6. 2024	Administrátor WEDA	Splněno
20240002	4	OBCHODNÍ KROKY	Nabídka		23. 5. 2024	Vaněk Jan	Naplánováno
20240002	5	OBCHODNÍ KROKY	Podpis smlouvy	Ano	28. 5. 2024	Vaněk Jan	Naplánováno
20240002	6	OBCHODNÍ KROKY	Archivace smlouvy		29. 5. 2024	Vaněk Jan	Naplánováno
20240002	8	PŘÍPRAVA STAVBY	Nákup materiálu		11. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	9	PŘÍPRAVA STAVBY	Dodávka materiálu		18. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	11	STAVBA	Stavba konstrukce		20. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	12	STAVBA	Montáž panelů		26. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	14	ELEKTRĪNA	Elektrické vedení		27. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	15	ELEKTRĪNA	Střídač		5. 7. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	16	ELEKTRĪNA	Baterie		8. 7. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	17	ELEKTRĪNA	Řídící jednotka		10. 7. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	18	ELEKTRĪNA	Připojení k elektrické síti		23. 7. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	19	PŘEDÁNÍ	Dokumentace		5. 8. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	21	PŘEDÁNÍ	Předání zákazníkovi	Ano	1. 8. 2024	Vaněk Jan	Naplánováno



3. EVIDENCE WEDA – WBS



Položky projektu

Projekt	P...	Etapa	Název	Milník?	Datum ...	Zodpovědná osoba	Stav
20240002							
20240002	3	OBCHODNÍ KROKY	Kontrola staveniště		20. 6. 2024	Administrátor WEDA	Splněno
20240002	4	OBCHODNÍ KROKY	Nabídka		23. 5. 2024	Vaněk Jan	Naplánováno
20240002	5	OBCHODNÍ KROKY	Podpis smlouvy	Ano	28. 5. 2024	Vaněk Jan	Naplánováno
20240002	6	OBCHODNÍ KROKY	Archivace smlouvy		29. 5. 2024	Vaněk Jan	Naplánováno
20240002	8	PŘÍPRAVA STAVBY	Nákup materiálu		11. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	9	PŘÍPRAVA STAVBY	Dodávka materiálu		18. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	11	STAVBA	Stavba konstrukce		20. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	12	STAVBA	Montáž panelů		26. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	14	ELEKTŘINA	Elektrické vedení		27. 6. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	15	ELEKTŘINA	Střídač		5. 7. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	16	ELEKTŘINA	Baterie		8. 7. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	17	ELEKTŘINA	Řídící jednotka		10. 7. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	18	ELEKTŘINA	Připojení k elektrické síti		23. 7. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	19	PŘEDÁNÍ	Dokumentace		5. 8. 2024	Administrátor WEDA	Naplánováno
20240002	21	PŘEDÁNÍ	Předání zákazníkovi	Ano	1. 8. 2024	Vaněk Jan	Naplánováno

POROVNÁNÍ



	Projekty Open	P4W	EVIDENCE WEDA
Plánování projektu	✓	✓	✓
Řízení úkolů	✓	✓	✓
Řízení zdrojů	✓	✓	✗
Rozpočty, náklady	✓	✗	✓
Reporting	✗	✗	✗

POROVNÁNÍ



	Projekty Open	P4W	EVIDENCE WEDA
Komunikace (chat)	x	✓	x*
Řízení dokumentů	✓	✓	✓
Integrace	x	x	x*
Řízení přístupů a práv	✓	x	✓
Podpora workflow	✓	x	x*

OTÁZKY?

KONFERENCE ORTEX
30.-31. 5. 2024

